



ВЗАИМООБУЧЕНИЕ МОСКОВСКИХ ШКОЛ СЕМИНАР




РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «ШКОЛА СТАРШЕКЛАССНИКОВ» В ШКОЛЕ №1502 НА ПРИМЕРЕ ЗДАНИЯ 65-426/1 «САМОЛЕТИК»

Чудов Владимир Львович,
директор
ГБОУ Школа №1502 при МЭИ


ЦЕЛИ ПРОЕКТА



СОЗДАНИЕ СОВРЕМЕННОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА



ФОРМИРОВАНИЕ НОВОЙ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ



РАЗВИТИЕ ПРЕДПРОФИЛЬНОГО, ПРОФИЛЬНОГО И ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ



СОЗДАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА ПЕДАГОГОВ

КРИТЕРИИ ОТБОРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПРОЕКТЕ



- ✓ НАЛИЧИЕ ДВУХ И БОЛЕЕ ЗДАНИЙ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
- ✓ НАЛИЧИЕ ТРЕХ И БОЛЕЕ КЛАССОВ В ПАРАЛЛЕЛЯХ 8-11 КЛАССОВ
- ✓ РАЗМЕЩЕНИЕ ШКОЛЫ СТАРШЕКЛАССНИКОВ В ЗДАНИИ С ПРОЕКТНОЙ МОЩНОСТЬЮ > 500
- ✓ РЕЗУЛЬТАТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ГОРОДСКИХ ПРОЕКТАХ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
- ✓ ВЫСОКИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВКЛАДА ШКОЛЫ В РАЗВИТИЕ СТОЛИЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
- ✓ НАЛИЧИЕ РЕСУРСОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ШКОЛЫ
- ✓ СОГЛАСОВАНИЕ РЕШЕНИЯ О ВХОЖДЕНИИ В ПРОЕКТ УПРАВЛЯЮЩИМ СОВЕТОМ
- ✓ НАЛИЧИЕ УЧИТЕЛЕЙ, ПРОШЕДШИХ ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПО РАБОТЕ С ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ

ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТЕЙ ШКОЛЫ

- МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА
- ЗДАНИЯ
- КАДРЫ

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ

- УПРАВЛЯЮЩИЙ СОВЕТ
- ШКОЛА СТУПЕНЕЙ

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ РЕШЕНИЙ

- РАЗРАБОТКА ЕДИНОЙ
КОНЦЕПЦИИ
- ДИЗАЙН
- ПРОФИЛИЗАЦИЯ

ФОРМИРОВАНИЕ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ

- ПРОЕКТНАЯ И СМЕТНАЯ
ДОКУМЕНТАЦИЯ
- ФОРМИРОВАНИЕ ЛОТОВ
- ТОРГИ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

- МОНИТОРИНГ

ОСНАЩЕНИЕ ШКОЛЫ

- ИНТЕГРАЦИЯ
ОБОРУДОВАНИЯ
ГОРОДСКИХ ПРОЕКТОВ

ЭТАП 1: ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТЕЙ ШКОЛЫ

ВЫБОР ЗДАНИЯ

- УЧЕТ СПЕЦИФИКИ СТАРШЕЙ ШКОЛЫ
- ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ


СОЗДАНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ

- ГОТОВНОСТЬ К ПРОВЕДЕНИЮ
РЕМОНТНЫХ РАБОТ
- ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

- КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
- ПРОГРАММЫ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

ЭТАП 1: ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТЕЙ ШКОЛЫ ФИНАНСИРОВАНИЕ

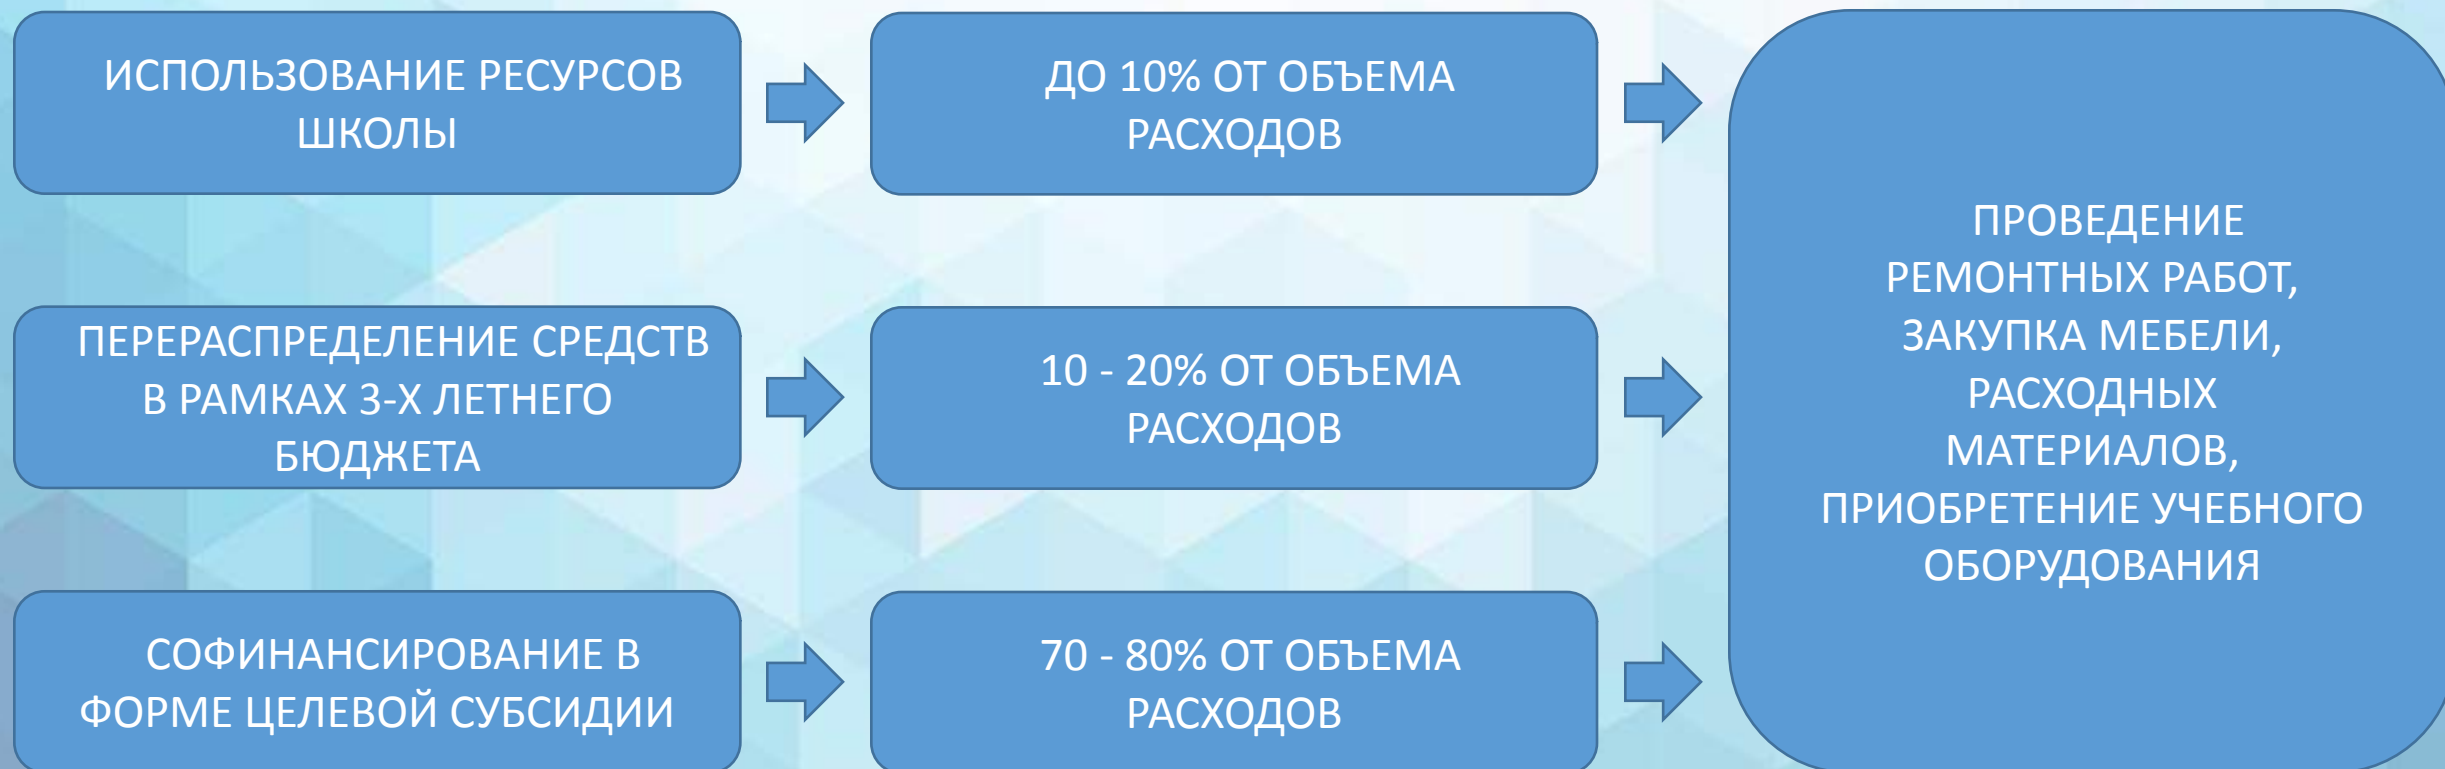

ЭТАП 2: ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ



ЭТАП 3: ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ РЕШЕНИЙ

- ОТКРЫТЫЕ ТРАНСФОРМИРУЕМЫЕ ПРОСТРАНСТВА
- БОЛЬШИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ КЛАСТЕРЫ
- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВСЕХ ДОСТУПНЫХ ПЛОЩАДЕЙ ЗДАНИЯ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
- СОЗДАНИЕ КОВОРКИНГ ПРОСТРАНСТВ
- СОЗДАНИЕ ПОЛИГОНА ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
- ИНТЕГРАЦИЯ С «УМНОЙ ШКОЛОЙ»

ЭТАП 3: ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ РЕШЕНИЙ

ПЕРЕПЛАНИРОВКА ЗДАНИЯ

- УЧИТЫВАТЬ ОСОБЕННОСТИ СТАРШЕЙ ШКОЛЫ
- УЧИТЫВАТЬ РАЗМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
- СОБЛЮДАТЬ НОРМЫ САНПИН 2.4.2.2821-10
- СОБЛЮДАТЬ ПОЖАРНЫЕ НОРМЫ

РАЗРАБОТКА ДИЗАЙН-ПРОЕКТА

- ГОТОВЫЙ ДИЗАЙН-ПРОЕКТ
- ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
- РЕСУРСЫ ПОДРЯДЧИКА

ЗАКУПКА МЕБЕЛИ

- СОВРЕМЕННАЯ
- ТРАНСФОРМИРУЕМАЯ
- МОДУЛЬНАЯ

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕПЛАНИРОВКИ ПРОЕКТ 65-426/1 «Самолетик»




1 ЭТАЖ

- АДМИНИСТРАТИВНЫЕ КАБИНЕТЫ
- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ БЛОК
- МЕДИЦИНСКИЙ КАБИНЕТ
- БИБЛИОТЕКА И МЕДИАТЕКА
- ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ БЛОК

2 ЭТАЖ

- ЛАБОРАТОРИИ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН
- ИНЖЕНЕРНЫЙ И АКАДЕМИЧЕСКИЙ КЛАССЫ
- IT – ПОЛИГОН
- РОБО-КЛАСС
- ЛЕКТОРИЙ

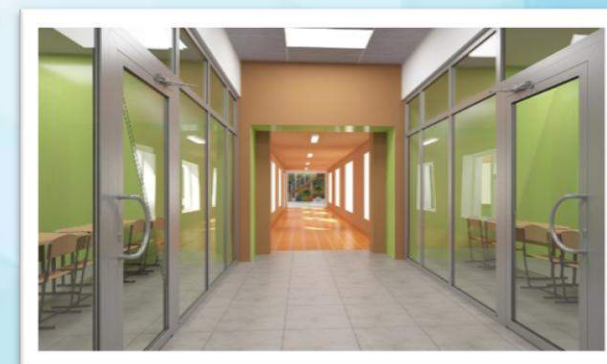


3 ЭТАЖ и АКТОВЫЙ ЗАЛ


- КАБИНЕТЫ ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН
- ЛИНГОФОННЫЕ КЛАССЫ
- СОЗДАНИЕ КОВОРКИНГА ВМЕСТО АКТОВОГО ЗАЛА
- ИНТЕГРАЦИЯ С «УМНОЙ ШКОЛОЙ»




ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕПЛАНИРОВКИ ПРОЕКТ 65-426/1 «Самолетик» 1 ЭТАЖ

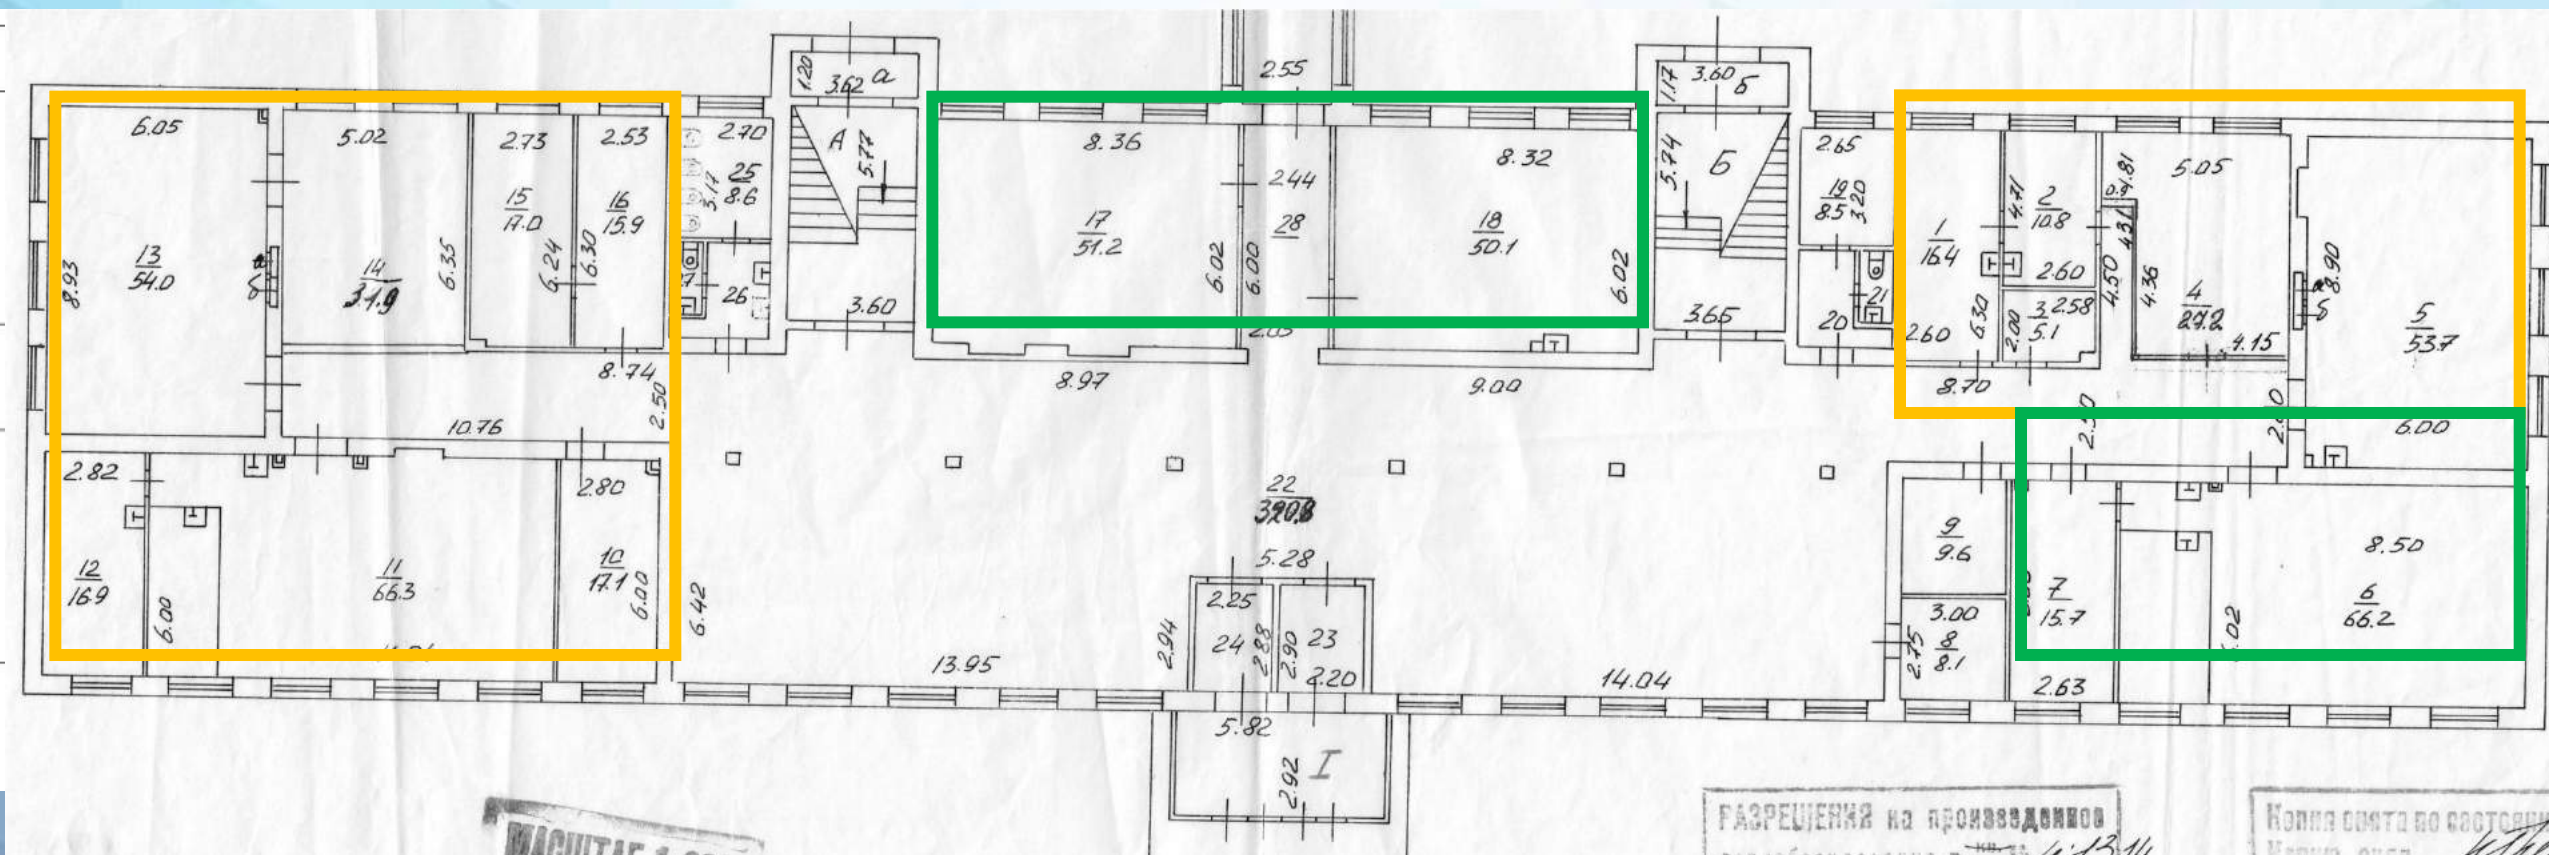

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕПЛАНИРОВКИ ПРОЕКТ 65-426/1 «Самолетик» 2 ЭТАЖ

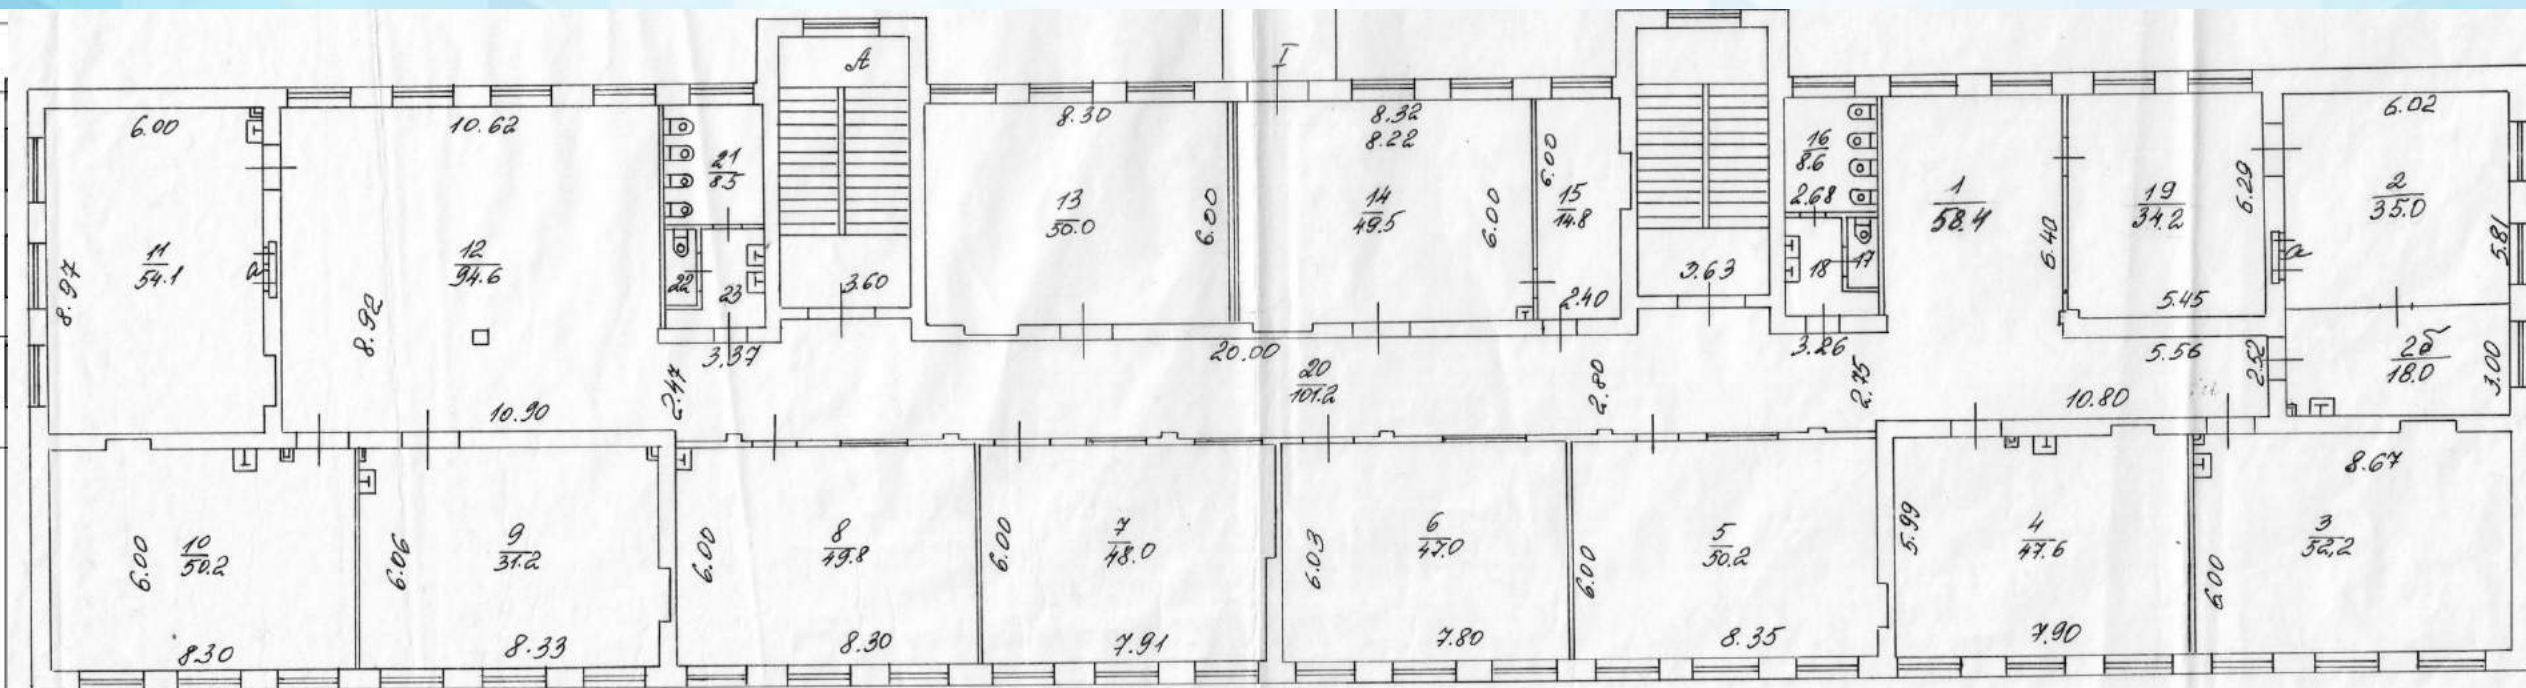

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕПЛАНИРОВКИ ПРОЕКТ 65-426/1 «Самолетик» 3 ЭТАЖ

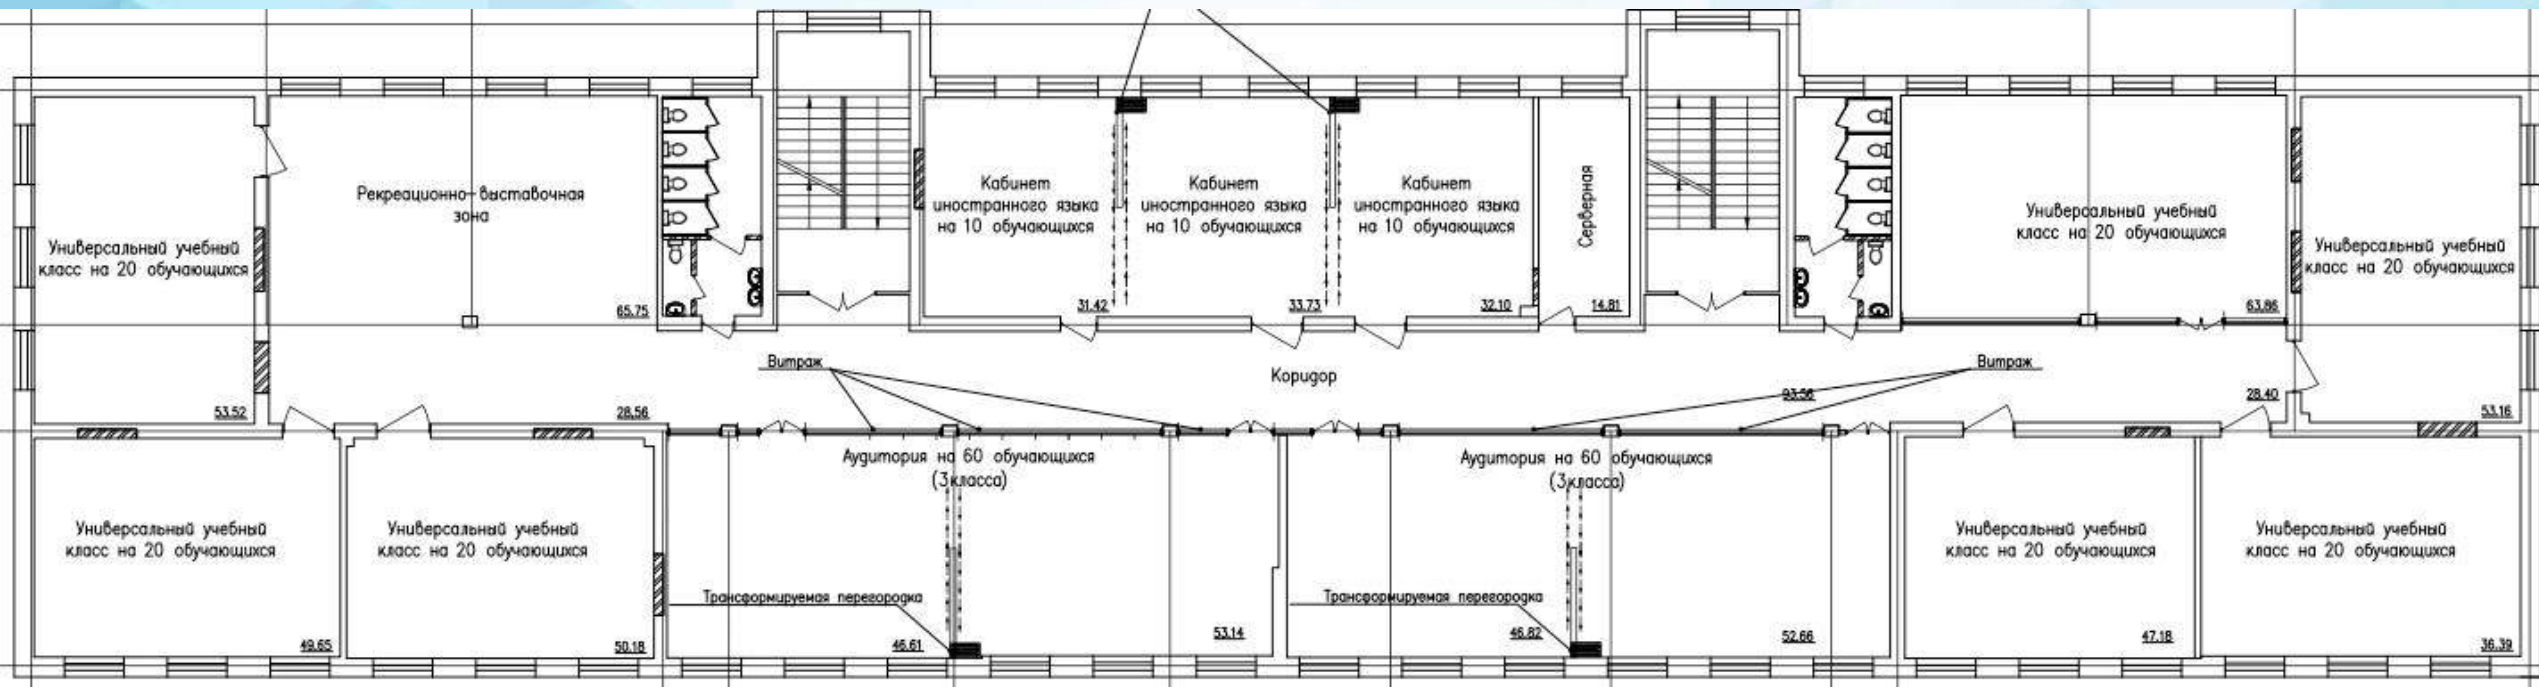

ЛАБОРАТОРИИ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН



ОБЪЕДИНЕНИЕ ЛАБОРАТОРИЙ В ЕДИНЫЙ КОМПЛЕКС ПОЗВОЛЯЕТ СОЗДАТЬ
МЕЖПРЕДМЕТНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ СРЕДУ, ГДЕ УЧАЩИЕСЯ ИМЕЮТ
ДОСТУП К ОСНОВНЫМ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ



ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЛАБОРАТОРИЙ – 450 КВ.М.
ВКЛЮЧАЯ ЛАБОРАТОРИЮ ХИМИИ – 68 КВ.М.
ЛАБОРАТОРИЮ БИОЛОГИИ – 100 КВ.М.
ЛАБОРАТОРИЮ ФИЗИКИ – 98 КВ.М.
ИНЖЕНЕРНЫЕ КЛАССЫ – 120 КВ.М.
ЛАБОРАНТСКИЕ – 64 КВ.М.



ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ БЛОК



МОДЕРНИЗАЦИЯ, А ТАК ЖЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ПЛОЩАДИ БЫВШИХ МАСТЕРСКИХ ПОЗВОЛИТ СОЗДАТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ БЛОК, ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ В СЕБЕ:

АВТОМАТИЗИРОВАННУЮ ОБРАБОТКУ МАТЕРИАЛОВ

РУЧНОЙ ТРУД

ПРОТОТИПИРОВАНИЕ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

МОДЕЛИРОВАНИЕ



IT-ПОЛИГОН И КОВОРКИНГ

ИСПОЛЬЗУЯ ПЛОЩАДИ ВТОРОГО ЭТАЖА И АКТОВОГО ЗАЛА
МОЖНО СОЗДАТЬ УНИКАЛЬНУЮ IT ПЛОЩАДКУ, ПОЗВОЛЯЮЩУЮ
РАЗВИВАТЬ ТАКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ, КАК:

ПРОГРАММИРОВАНИЕ

ПРОТОТИПИРОВАНИЕ

МАКЕТИРОВАНИЕ

РОБОТОТЕХНИКА

МЕХАТРОНИКА

ГРАФИКА

ДИЗАЙН



СПОРТИВНЫЙ И МЕДИЦИНСКИЙ БЛОКИ



ПЕРЕПЛАНИРОВКА ЛЕВОГО КРЫЛА 1 ЭТАЖА
ПОЗВОЛЯЕТ СОЗДАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
СПОРТИВНЫЙ БЛОК:

- ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ – 53 КВ.М.
- ЗАЛ АЭРОБИКИ – 52 КВ.М.
- РАЗДЕВАЛКИ – 30 КВ.М.
- ТРЕНЕРСКАЯ – 7 КВ.М.



А ТАКЖЕ ПОЗВОЛЯЕТ РАЗМЕСТИТЬ
ТАМ МЕДИЦИНСКИЙ БЛОК,
ОТВЕЧАЮЩИЙ ПОСЛЕДНИМ НОРМАМ САНПИН

ЭТАП 4: ФОРМИРОВАНИЕ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ ПРОБЛЕМ

- ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
- ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И КОММУНИКАЦИИ
- СЛАБЫЕ ТОКИ
- ВЕНТИЛЯЦИЯ
- АПС И ОС

СОЗДАНИЕ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ

- РАЗРАБОТКА ЕДИНОЙ КОНЦЕПЦИИ
- РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
- ФОРМИРОВАНИЕ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
- ФОРМИРОВАНИЕ ЗАКУПОК ПО ОСНАЩЕНИЮ

ФОРМИРОВАНИЕ ЛОТОВ

- УЧИТЫВАТЬ ОСОБЕННОСТИ РЕМОНТА
- УЧИТЫВАТЬ ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ
- УЧИТЫВАТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЭТАПНОЙ ОПЛАТЫ

ЭТАП 4: ФОРМИРОВАНИЕ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ РАЗРАБОТКА СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ



1.ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА С ПРОЕКТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ НА РАЗРАБОТКУ СМЕТ



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГКУ ДИРЕКЦИЕЙ ПО
СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ДОГМ

ЭТАП 4: ФОРМИРОВАНИЕ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ



КАЖДАЯ ЗАКУПКА, ВКЛЮЧЕННАЯ В ДОРОЖНУЮ КАРТУ, СОДЕРЖИТ В СЕБЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕННОГО ВИДА РАБОТ, ЧТО НЕ ПРОТИВОРЕЧИТ 44-ФЗ И НЕ ДОПУСКАЕТ ДРОБЛЕНИЕ ЗАКУПКИ

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ:

- СОСТАВЛЕНИЕ ДЕФЕКТНОЙ ВЕДОМОСТИ И ПЕРЕДАЧА ЕЕ СМЕТЧИКУ
- СОСТАВЛЕНИЕ СМЕТЫ
- СОСТАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ СОВМЕСТНО С ИНЖЕНЕРНЫМ СОСТАВОМ ШКОЛЫ
- ФОРМИРОВАНИЕ ЛОТА И НАПРАВЛЕНИЕ ЕГО НА СОГЛАСОВАНИЕ ГРБС
- ПРОХОЖДЕНИЕ МРГ
- УСТАНОВЛЕНА ТОЧНАЯ ДАТА ПУБЛИКАЦИИ АУКЦИОНА
- ОПРЕДЕЛЕНА РЕГЛАМЕНТНЫЕ СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА БЕЗ УЧЕТА ВОЗМОЖНЫХ ЖАЛОБ ИЛИ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В РАЗМЕЩЕННУЮ АУКЦИОННУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ
- ОПРЕДЕЛЕНА СРОКИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА ПО КАЖДОЙ ПРОЦЕДУРЕ

ЭТАП 4: ФОРМИРОВАНИЕ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ



Детальное составление дорожной карты каждой закупки
требуется для правильной организации исполнения Контракта

Лот № 7 «Выполнение работ по текущему ремонту зданий и (или) сооружений образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы, в рамках проекта «Создание современного образовательного пространства - Школа старшекласников»» (Лот № 7), [НМЦК 8 517 693.12 руб.](#)


№ п.п.	Вид работы	Сроки проведения	Ответственное лицо
1	Составление дефектной ведомости	Февраль 2018	Чудов В.Л. – директор ГБОУ Лицей №1502 при МЭИ; Шеремет Л.Л. – первый заместитель директора по ресурсам
2	Составление АПР (архитектурно-планировочное решение)	Март 2018	Чудов В.Л. – директор ГБОУ Лицей №1502 при МЭИ; Шеремет Л.Л. – первый заместитель директора по ресурсам
3	Составление локальной сметы	Март 2018	Чудов В.Л. – директор ГБОУ Лицей №1502 при МЭИ; Шеремет Л.Л. – первый заместитель директора по ресурсам
4	Утверждение локальной сметы	06 апреля 2018	Чудов В.Л. – директор ГБОУ Лицей №1502 при МЭИ; Шеремет Л.Л. – первый заместитель директора по ресурсам
5	Подготовка аукционной документации по текущему ремонту (Создание лота,	09 апреля 2018	Чудов В.Л. – директор ГБОУ Лицей №1502 при МЭИ; Шеремет Л.Л. – первый заместитель директора по ресурсам
	Согласование РГ ГРБС)		
6	Получение согласования РГ ГРБС, отправка на	10 апреля 2018	Чудов В.Л. – директор ГБОУ Лицей №1502 при МЭИ; Шеремет Л.Л. – первый

0	Получение согласования РГ ГРБС, отправка на согласование РГ МРГ	10 апреля 2018	Чудов В.Л. – директор ГБОУ Лицей №1502 при МЭИ; Шеремет Л.Л. – первый заместитель директора по ресурсам
7	Получение согласования МРГ, формирование процедуры	20 апреля 2018	Чудов В.Л. – директор ГБОУ Лицей №1502 при МЭИ; Шеремет Л.Л. – первый заместитель директора по ресурсам
8	Проведение заседания РГ	24 апреля 2018	Чудов В.Л. – директор ГБОУ Лицей №1502 при МЭИ; Шеремет Л.Л. – первый заместитель директора по ресурсам
9	Направление заявки на согласование публикации	24 апреля 2018	Чудов В.Л. – директор ГБОУ Лицей №1502 при МЭИ; Шеремет Л.Л. – первый заместитель директора по ресурсам
10	Публикация извещения на ЕИС	28 апреля 2018	Чудов В.Л. – директор ГБОУ Лицей №1502 при МЭИ; Шеремет Л.Л. – первый заместитель директора по ресурсам
11	Окончание срока рассмотрения первых частей заявок	16 мая 2018	Чудов В.Л. – директор ГБОУ Лицей №1502 при МЭИ; Шеремет Л.Л. – первый заместитель директора по ресурсам
12	Дата проведения аукциона	21 мая 2018	Чудов В.Л. – директор ГБОУ Лицей №1502 при МЭИ; Шеремет Л.Л. – первый заместитель директора по ресурсам

ЭТАП 4: ФОРМИРОВАНИЕ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ

Детальное составление дорожной карты каждой закупки требуется для правильной организации исполнения Контракта

10	Публикация извещения на ЕИС	28 апреля 2018	Чудов В.Л. – директор ГБОУ Лицей №1502 при МЭИ; <u>Шеремет Л.Л.</u> – первый заместитель директора по ресурсам
----	-----------------------------	----------------	---

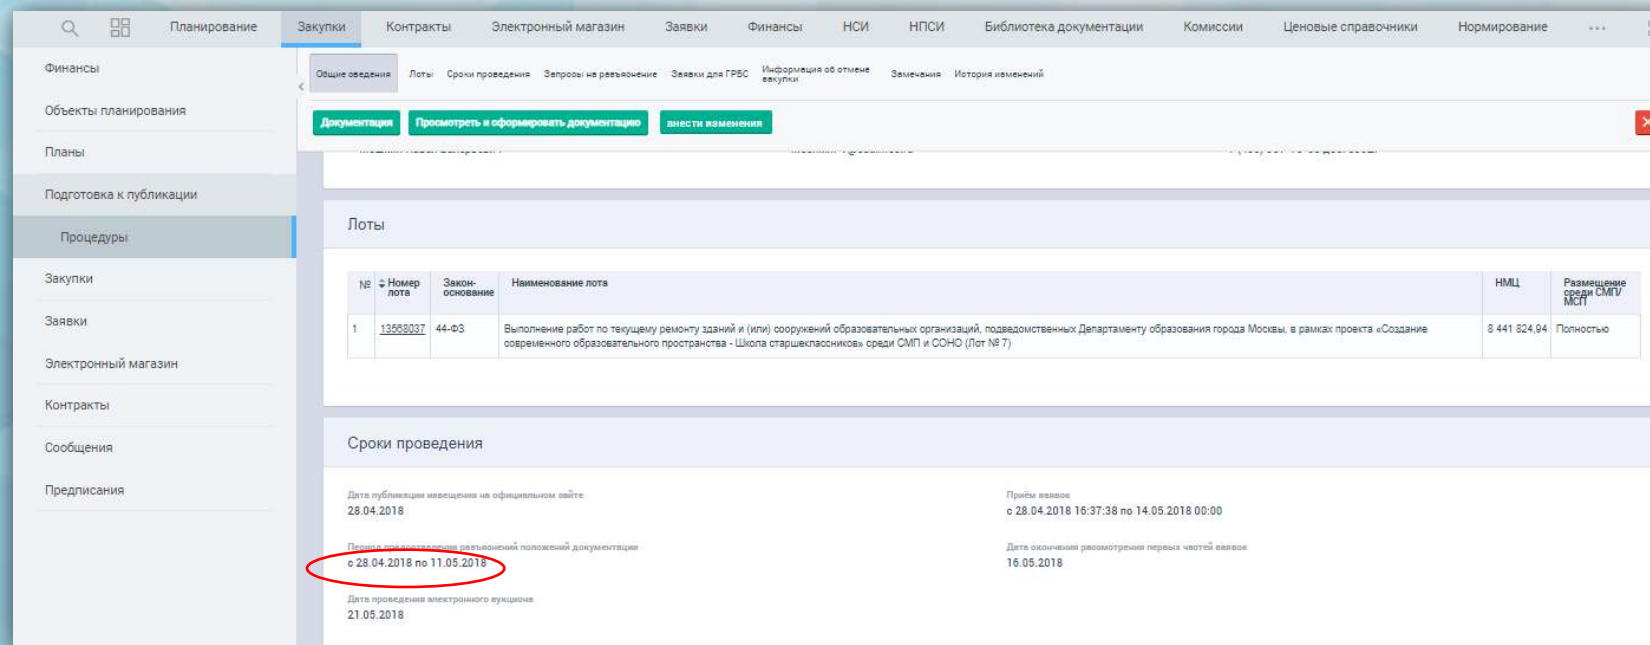

The screenshot shows the 'Закупки' (Procurements) section of the portal. The left sidebar contains a menu with items like 'Финансы', 'Объекты планирования', 'Планы', 'Подготовка к публикации', 'Процедуры', 'Закупки', 'Заявки', 'Электронный магазин', 'Контракты', 'Сообщения', and 'Предписания'. The main content area is titled 'Лоты' (Lots) and displays a table with the following data:

№	Номер лота	Закон-основание	Наименование лота	НМЦ	Размещение среди СМЧ МЭИ
1	13558037	44-ФЗ	Выполнение работ по текущему ремонту зданий и (или) сооружений образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы, в рамках проекта «Создание современного образовательного пространства - Школа старших классов» среди СМП и СОНО (Лот № 7)	8 441 524,84	Полностью

Below the table, the 'Сроки проведения' (Deadlines) section is visible, showing the following dates:

- Дата публикации извещения на официальном сайте: 28.04.2018
- Принять участие: с 28.04.2018 16:37:38 по 14.05.2018 00:00
- После окончания рассмотрения заявок документация: с 28.04.2018 по 11.05.2018 (circled in red)
- Дата окончания рассмотрения первых частей заявок: 16.05.2018
- Дата проведения электронного аукциона: 21.05.2018

ЭТАП 4: ФОРМИРОВАНИЕ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПОК



- ПЛАНИРОВАНИЕ
- ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СЛУЖБОЙ КОНТРАКТНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО ДОММ
- СОБЛЮДЕНИЕ СРОКОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ В ДОРОЖНОЙ КАРТЕ
- ЕЖЕДНЕВНЫЙ КОНТРОЛЬ РАЗМЕЩЕННЫХ ПРОЦЕДУР, ОТСЛЕЖИВАНИЕ ЗАПРОСОВ НА РАЗЪЯСНЕНИЯ
- СОБЛЮДЕНИЕ РЕГЛАМЕНТНЫХ СРОКОВ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ 44 ФЗ
- СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ЭТАП 4: ФОРМИРОВАНИЕ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ



КРАТКИЙ СПИСОК НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

- Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ;
- Распоряжение Правительства Москвы от 16 мая 2014 г. N 242-РП "Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), для обеспечения нужд города Москвы»;
- Постановление Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом...»;
- Постановление Правительства Москвы от 24 февраля 2012 г. N 67-ПП "О системе закупок города Москвы" (с изменениями и дополнениями);
- Федеральный закон "Об электронной подписи" от 06.04.2011 N 63-ФЗ;
- Постановление Правительства РФ от 26 сентября 2016 г. № 968 "Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов радиоэлектронной продукции, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
- Действующие ГОСТ, СНИП, ТУ и прочие;

ЭТАП 4: ФОРМИРОВАНИЕ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ

Локальные Акты ГБОУ Школа № 1502 при МЭИ

- Приказ о создании комиссии по осуществлению закупок в рамках 44-ФЗ
- Положение о комиссии по осуществлению закупок в рамках 44-ФЗ
- Приказ об утверждении методики проведения контрольных обмеров по текущему ремонту
- Приказ о назначении ответственных лиц
- Приказ о пропуске сотрудников подрядной организации на Объект
- Акт об открытии Объекта

*С указанными документами можно ознакомиться
на сайте ГБОУ Школа № 1502 при МЭИ в разделе Документы*

ЭТАП 4: ФОРМИРОВАНИЕ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ



Список сервисов по проверке участников
закупок на соответствие требованиям 44 ФЗ

- ➔ Сайт ФНС <https://www.nalog.ru>
- ➔ Торговая площадка РТС-тендер <https://www.rts-tender.ru>
- ➔ Реестр недобросовестных поставщиков
<http://zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier/quicksearch/search.html>
- ➔ Реестр юридических лиц, привлеченных к административной ответственности за незаконное вознаграждение <https://www.genproc.gov.ru/anticor/register-of-illegal-remuneration>
- ➔ Реестр лицензий МЧС - <https://www.mchs.gov.ru/dop/services/licensereestr>

ЭТАП 5: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

ОРГАНИЗАЦИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ СЛУЖБЫ ШКОЛЫ

КОНТРОЛЬ ЗА СРОКАМИ ВЫПОЛЕНИЯ РАБОТ

ПРОВЕДЕНИЕ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫХ ПЛАНЕРОВ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОДРЯДЧИКОВ МЕЖДУ СОБОЙ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГКУ ДИРЕКЦИЕЙ

ЭТАП 5: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ



ПРАВО НА РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА В ОДНОСТОРОННЕМ ПОРЯДКЕ

ЭТАП 6: ОСНАЩЕНИЕ ШКОЛЫ

ПОСТАВКА МЕБЕЛИ



ПОСТАВКА
ИНТЕРАКТИВНОГО
КОМПЛЕКСА



ПОСТАВКА УЧЕБНОГО
ОБРУДОВАНИЯ

ЭТАП 6: ОСНАЩЕНИЕ ШКОЛЫ ГОРОДСКИЕ ПРОЕКТЫ



Инженерный класс в
московской школе



Академический класс
в московской школе



Робо-класс в
московской школе



IT- полигон



Астрономия

«ШКОЛА СТАРШЕКЛАССНИКОВ» РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ



- ТРАНСФОРМИРУЕМЫЕ ПРОСТРАНСТВА
- МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ ЛАБОРАТОРИИ
- МОДУЛЬНАЯ МЕБЕЛЬ



УВЕЛИЧЕНИЕ ПЛОЩАДЕЙ,
ЗАДЕЙСТВОВАННЫХ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

СОЗДАНИЕ КОВОРКИНГ
ПРОСТРАНСТВА
(ВМЕСТО АКТОВОГО ЗАЛА)



ИНТЕГРАЦИЯ ПРОСТРАНСТВА В
УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС
СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ ПОЛИГОН
КОВОРКИНГ

СОВМЕЩЕННЫЕ ЛАБОРАНТСКИЕ
СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ



ОПТИМИЗАЦИЯ ХРАНЕНИЯ
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ



«ШКОЛА СТАРШЕКЛАССНИКОВ» ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



СЕЙЧАС

ПЛАНИРУЕТСЯ

Увеличение контингента школы

307

550

Увеличение числа профилей

Инженерный

Инженерный

IT

Естественнонаучный

Развитие доп. образования

32 кружка

65 кружков

ИНТЕРАКТИВ



ВОПРОС 1



Выберите критерии отбора участников проекта «Школа старшеклассников»:

- а. Наличие 5 и более зданий для обучения школьников
- б. Наличие 3 и более классов в параллелях 8-11
- с. Обязательное участие школы в городских проектах: Инженерный класс, Кадетский класс
- д. Проектная мощность здания > 500
- е. Высокие образовательные результаты вклада школы в развитие столичного образования

ВОПРОС 2

Расставьте основные этапы планирования в правильном порядке:

- а. Принятие решения
- б. Оснащение школы
- с. Текущий ремонт
- д. Индивидуализация решения
- е. Оценка возможностей
- ф. Формирование дорожной карты

ВОПРОС 2



Расставьте основные этапы планирования в правильном порядке:

- а. Оценка возможностей
- б. Принятие решения
- с. Индивидуализация решения
- д. Формирование дорожной карты
- е. Текущий ремонт
- ф. Оснащение школы

ВОПРОС 3

Выберите оптимальный размер софинансирования в случае перераспределения средств 3-х летнего бюджета:

- а. До 10%
- б. 10-20%
- с. 70-80%

ВОПРОС 4



Какая площадь необходима для размещения лабораторий инженерного класса:

- а. До 80 кв.м
- б. От 100 до 120 кв.м
- с. От 150 до 200 кв.м.

ВОПРОС 5



Планирование дорожной карты начинается с :

- а. Формирования закупок по оснащению
- б. Разработки проектной документации
- с. Разработки единой концепции
- д. Формирования сметной документации

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
